

OMÓWIENIE STATUSU PROJEKTU BALTIC PIPE

Adam Marzecki, Dział Współpracy Biznesowej,
Pion Strategicznych Inwestycji
GAZ-SYSTEM S.A.
Warszawa, 30 września 2021 r.



Dofinansowane przez
Unię Europejską

PROGRAM BALTIC PIPE – ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

OFFSHORE

- ▶ W marcu 2021 dostarczono tarcze TBM na place budowy w Polsce i Danii. Pod koniec marca i na początku maja rozpoczęto drążenie kolejno w Polsce i w Danii.
- ▶ W maju 2021 zakończono dostawy rur do portu docelowego w Mukran (Niemcy).
- ▶ W czerwcu 2021 zakończono prace przy drążeniu 600-metrowego mikrotunelu w Polsce, w sierpniu podniesiono z dna morskiego tarczę TBM.
- ▶ W połowie lipca 2021 zakończono wiercenie ok. 1000-metrowego mikrotunelu w Danii.
- ▶ Na początku sierpnia 2021 sfinalizowano proces realizacji skrzyżowań gazociągu z infrastrukturą stron trzecich (m.in. z gazociągami NS1 oraz NS2).
- ▶ We wrześniu 2021 zakończono operację wciągania gazociągu do mikrotunelu w Polsce.
- ▶ Do połowy września ułożono ok. 250 km z 274 km gazociągu podmorskiego. Prace rozpoczęto w czerwcu 2021.



Zakończenie drążenia mikrotunelu w Danii



Podniesienie tarczy TBM z dna morskiego (Polska)



Przekroczenie bezwykopowe Direct Pipe pod rzeką Petcz (g. Goleniów – Lwówek)



Agregaty sprężarkowe Mars z kominami (TG Goleniów)

ONSHORE

- ▶ W marcu 2021 zakończono badania saperskie na trasie obydwu gazociągów. Nie zidentyfikowano żadnych niewybuchów.
- ▶ W kwietniu 2021, w ramach g. Goleniów – Lwówek zakończono przewierthy pod rzeką Petcz (657 m długości), w maju pod rzeką Obra (665 m długości), a lipcu pod rzeką Ina (796 m).
- ▶ W czerwcu 2021 zakończono dostawy inwestorskie dla wszystkich projektów realizowanych w cz. lądowej.
- ▶ W lipcu 2021 posadowiono wszystkie agregaty sprężarkowe (tłocznie gazu).
- ▶ Na początku września br., w ramach g. łączącego, sfinalizowano prace przygotowawcze (m.in. odhumusowanie oraz rozwózkę rur) oraz zakończono spawanie liniowe gazociągu DN1000.


PROGRAM BALTIC PIPE – DZIAŁANIA DO KOŃCA 2021 R.

OFFSHORE

- ▶ Podniesienie TBM spod dna morza w Danii, zainstalowanie urządzenia do wciągania gazociągu i jego wciągnięcie do mikrotunelu.
- ▶ Zakończenie układania gazociągu.

ONSHORE

- ▶ Zakończenie prac w zakresie przygotowania terenu oraz spawania liniowego na odcinku DN900 – gazociąg łączący.
- ▶ Zakończenie wykonania przewiertów i przycisków na trasie gazociągu Goleniów - Lwówek (etap II).
- ▶ Zakończenie konstrukcji stalowych budynków agregatów, zakończenie montażu mechanicznego agregatów wraz osprzętem w ramach dostaw inwestorskich. Zakończenie prac budowlanych pozostałych budynków (Tłocznie Gazu).

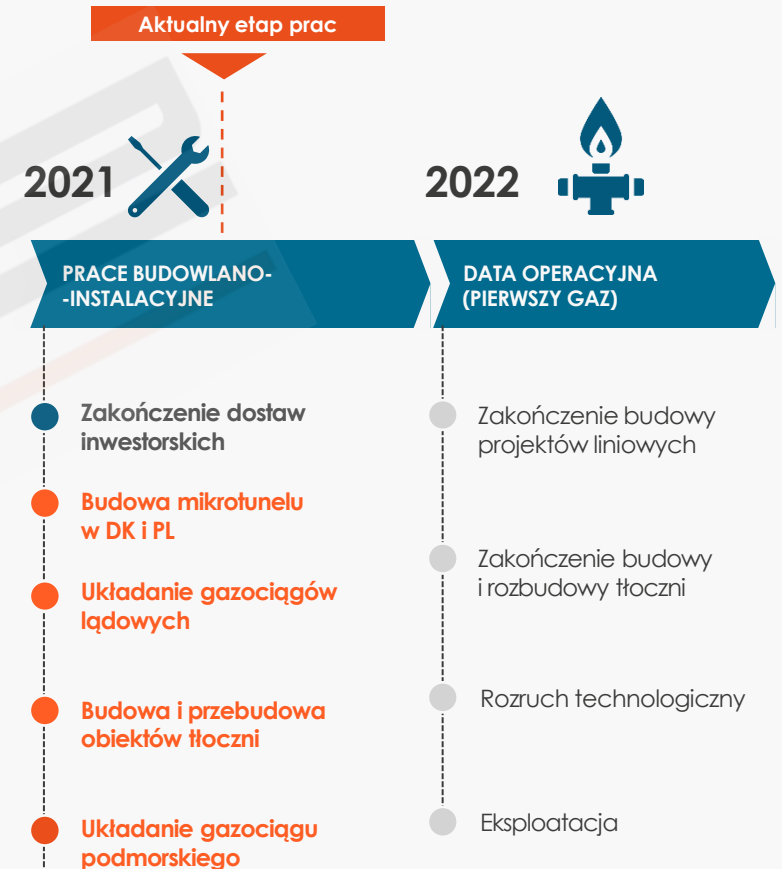

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
