

# **RAPORT OKRESOWY**

**Koordinacji Inwestycji: .....**

**z przyłączeniem do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEMU.**

**- aktualizacja statusów inwestycji**

stan na dzień: **dd.mm.rrrr**

# MAPA Z ZAKRESEM GŁÓWNYCH PRAC NA INWESTYCJI

Okresowy raport z postępu prac Stan na dd.mm.rrrr	Nazwa inwestycji	Zakres prac: Główny Wykonawca
		ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: 1.

Uwaga: Mapka lub Wizualizacja inwestycji.

HARMONOGRAM				
Podpisano umowę z WRB		Główne Kamienie Milowe Np. Rozruch	.....	.....
dd.mm.rrrr	Przewidywany / realny termin	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr
	Termin bazowy	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	0 dd.mm.rrrr



Legenda: KM zrealizowany Najbliższy KM KM nierozpoczęty ✘ Opóźniony KM w stosunku do terminu bazowego

**Powody opóźnień terminu osiągnięcia obecnie realizowanego kamienia milowego:**

Brak

Podjęte działania naprawcze

Nie dotyczy

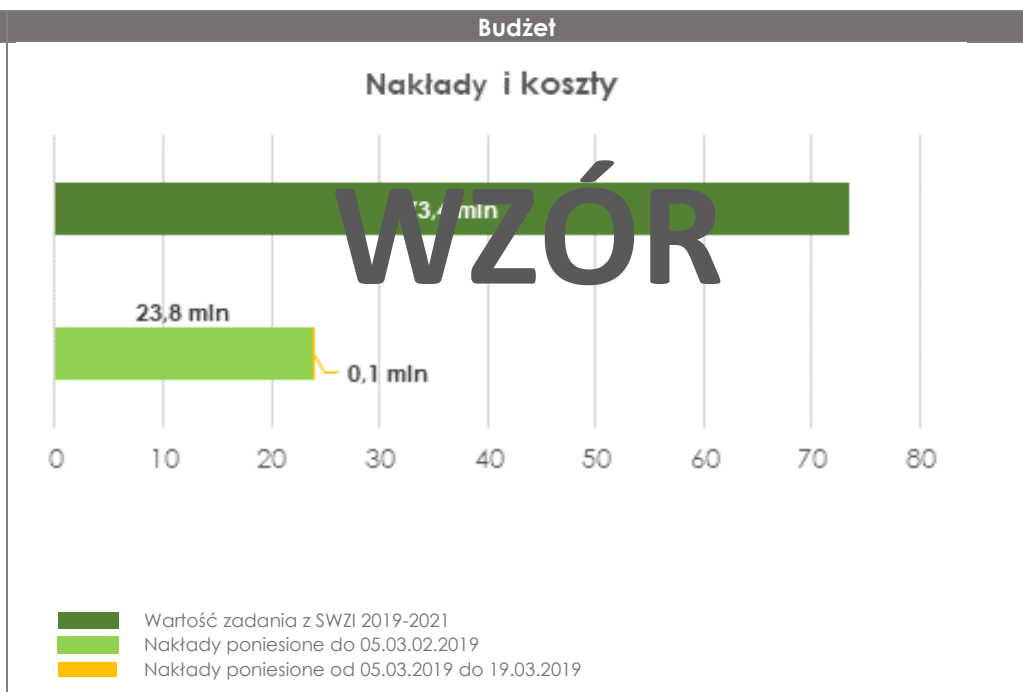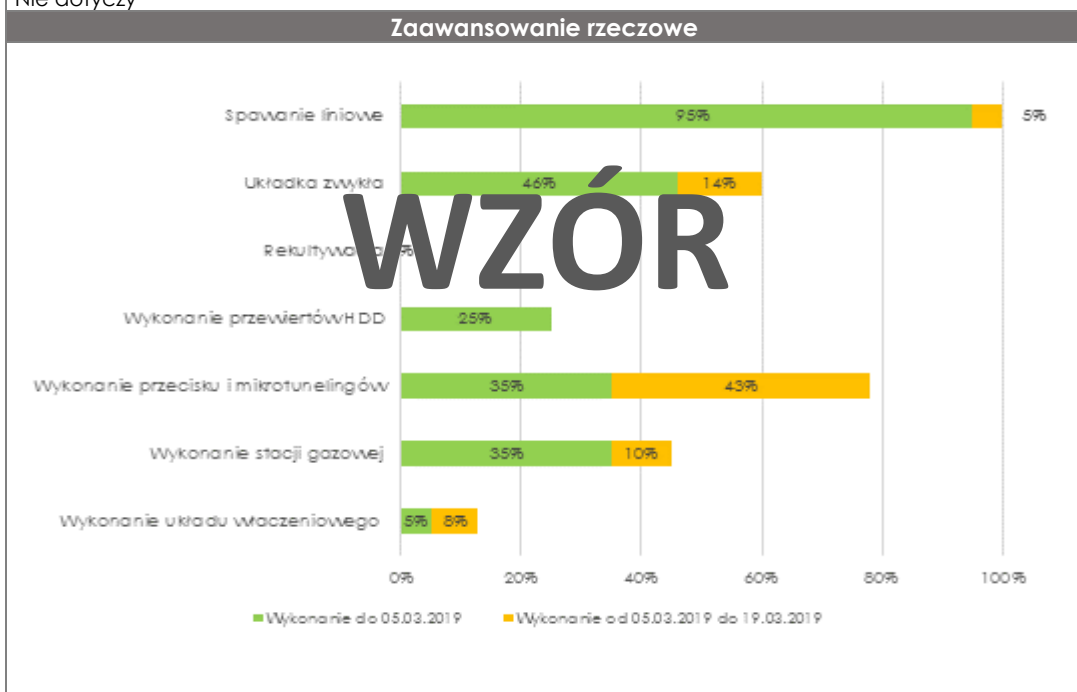

**Inne ważne informacje o projekcie**

Wykonane działania

**a. Miejsce działania**

i. Nazwa działania

Lp.	Opis potencjalnych ryzyk w następnych okresach raportowych	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Działania naprawcze
1	...	...	...

# WYKRES GANTA

